



POSTUPNOSŤ BÚRACÍCH PRÁČ


1.

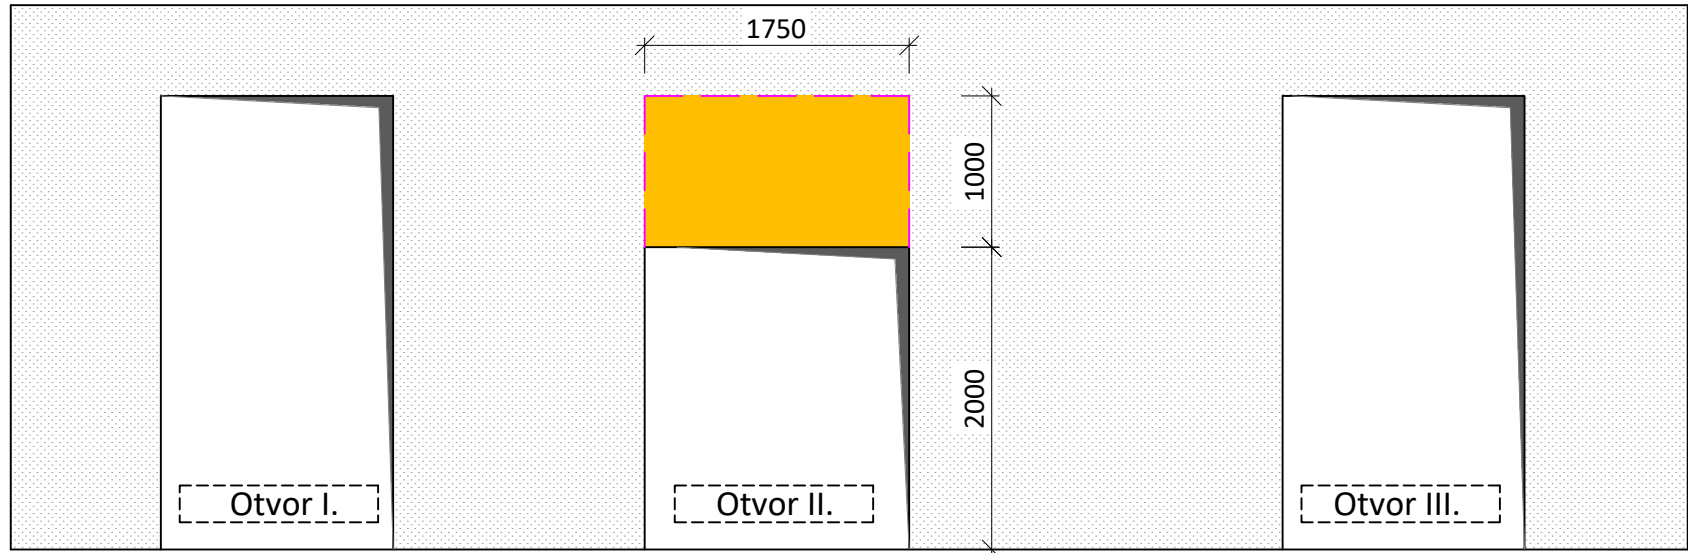

2.

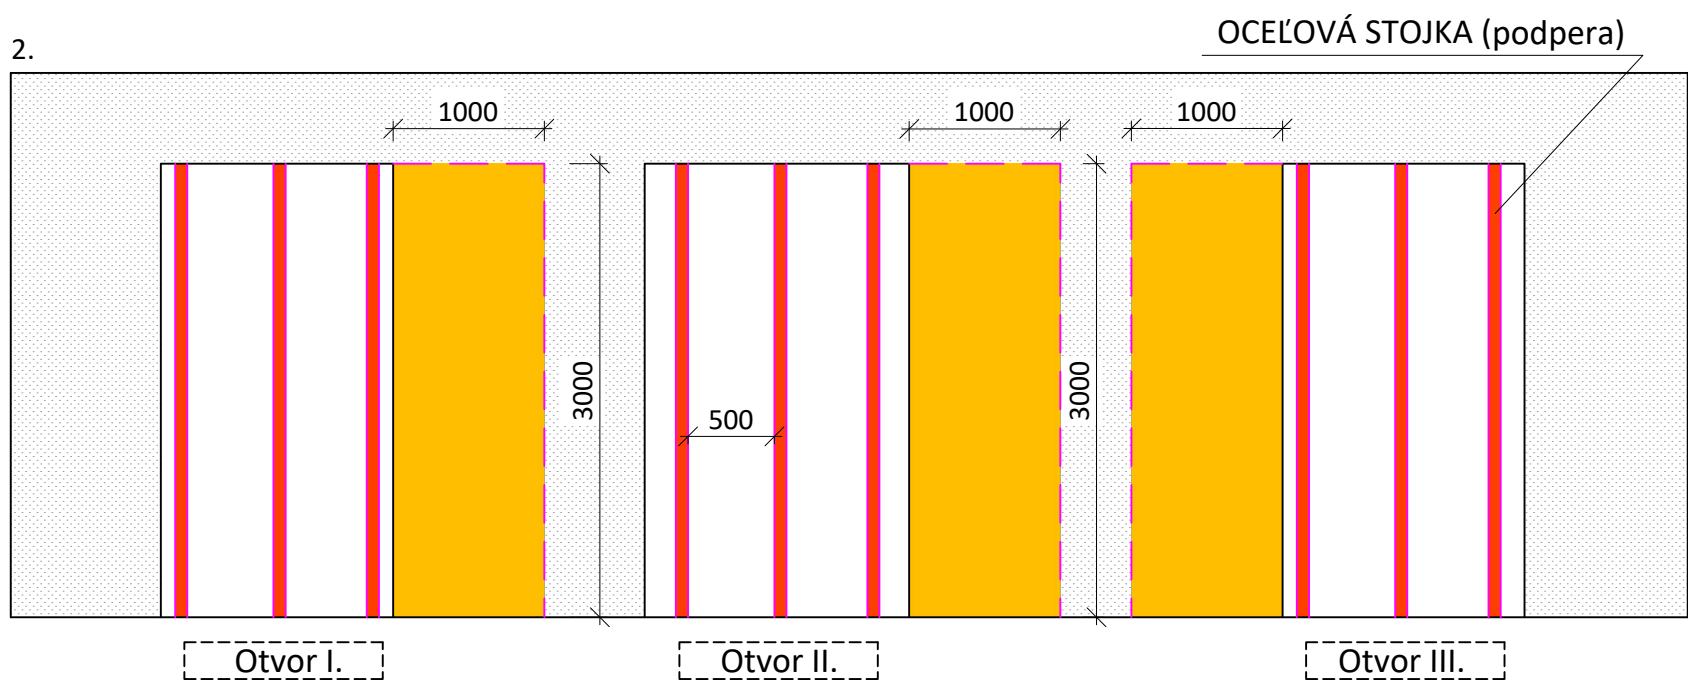

3.

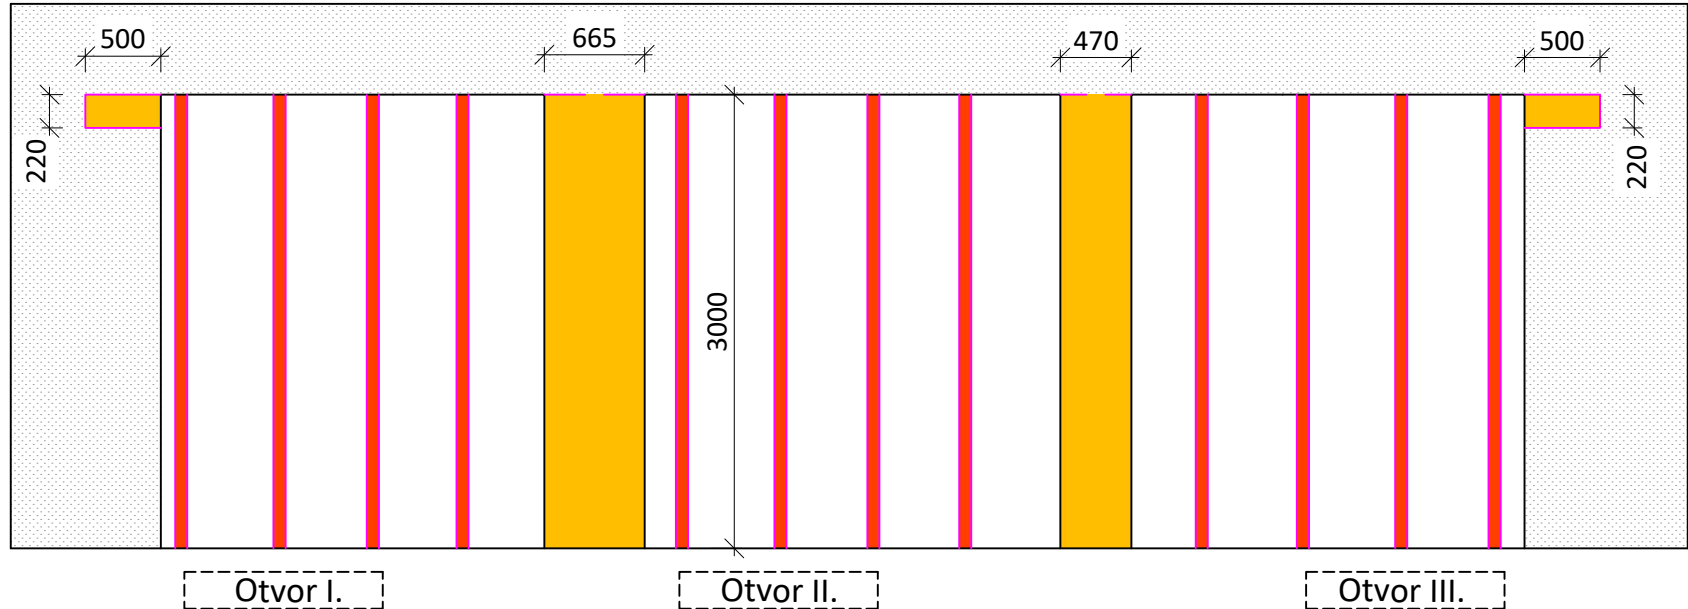

BÚRACIE PRÁČE:

1. VYBÚRANIE OTVORU č.II DO VÝŠKY 3000 MM OD PODLAHY (DO ROVNAKEJ VÝŠKY AKO EXISTUJÚCE OTVORY I A III)
2. PO VBÚRANÍ OTVORU č.II DO POŽADOVANEJ VÝŠKY JE NUTNÉ OTVORY PODSTOJKOVAŤ PODĽA NAVRHOVANEJ SCHÉMY, MEDZI STOJKU A EXISTUJÚCI PRIEVĽAK NAVRHUJEME PRE PRUŽNÉ PRENÁŠANIE UMIESTNIŤ DREVENÝ HRANOL HR. 150 X 200. NÁSLEDNE SA VYBÚRAJÚ ČASTI NOSNEJ STENY (1m Z KAŽDÉHO OTVORU)
3. PO VYBÚRANÍ ČASTI NOSNÝCH STIEN JE NUTNÉ UMIESTNIŤ DALŠIE STOJKY, PODĽA SCHÉMY (DO KAŽDÉHO OTVORU UMIESTNIME 4 STOJKY - oceľové podpery), PO UMIESTNENÍ POSLEDNÝCH TROCH KUSOV STOJK JE MOŽNÉ VYBÚRAŤ OSTÁVAJÚCE ČASTI NOSNEJ STENY A VYSEKAŤ KAPSY PRE UMIESTNENIE HEB PROFILOV (HLBKA KAPSY - 500mm)

POZNÁMKY:

- ROZMERY NA STAVBE JE POTREBNÉ PRIEBEŽNE KONTROLOVAŤ
- BÚRACIE AKO AJ NOVÉ STAVEBNÉ PRÁČE SA BUDÚ VYKONÁVAŤ POSTUPNOU METÓDOU
- VŠETKY ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE, DRUH, MNOŽSTVO A UMIESTNENIE VÝSTUŽE KONZULTOVAŤ SO STATIKOM!
- DODÁVATEĽ NESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY OD ZAČIATKU REALIZÁCIE!
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU SAMOTNÝCH PRÁČ KONZULTOVAŤ ICH SO STAVEBNÝM DOZOROM!
- NEJASNOSTI VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIESÚ V PROJEKTE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE ŠPECIFIKOVANÉ !
- OCEĽOVÝ HEB PROFIL ULOŽIŤ TAK ABY NEVZNIKLA ŠPÁRA MEDZI EXISTUJÚCIM PRIEVĽAKOM A HEB PROFILOM
- V PRÍPADE VZNIKNUTEJ ŠKÁRY JE NUTNÉ JU VYPLNIŤ EXPANZNOU MALTOU !
- SPOJE KONŠTRUKCIÍ REALIZOVAŤ PODĽA KONŠTRUKČNÝCH MATERIÁLOV JEDNOTLIVÝCH DODÁVATEĽOV!
- STĽPOVÉ TVÁRNICE JE NUTNÉ VYARMOVAŤ
- VŠETKY ŠPECIFIKÁCIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ A ARMATÚR SÚ V STATICKOM POSUDKU
- OTVORY JE NUTNÉ NEUSTÁLE PODOPIERAŤ STOJKAMI !!! AŽ PO VYTUHnutIE BETÓNU V PILIEROCH (min. 28 dní)
- PRE PRUŽNÉ ROZNÁŠANIE ZAŤAŽENIA POČAS PRÁČ ODPORÚČAME VSUNÚŤ MEDZI STOJKU A PRIEVĽAK DREVENÝ HRANOL
- DODÁVATEĽ SI V PRÍADE POTREBY NECHÁ VYPRACOVAŤ PROJEKT V STUPNI NA REALIZÁCIU !!!
- VŠETKY PRÁČE REALIZOVAŤ POD DOHLĎADOM STAVEBNÉHO DOZORA !!!



ZODP. PROJEKTANT.: VYPRACOVAL.: Ing. Pavol Furda	STAVEBNÍK: Obec Zemplínska Nová Ves, SR Hlavná 182/51, Úpor, 076 15	STUPEŇ: stavebné povolenie	DÁTUM: 02/2024
STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY NA KULTÚRNYM DOME s.č. 42/5 MIESTO: Obec Zemplínska Nová Ves - Zemplínsky Klečenov, ul. Úporská , okres Trebišov		PROFESIA: ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE	
PARCELY: p.č. 288 - Intravilán k. ú. Zemplínsky Klečenov		MIERKA: 1:50	Č.V.: A-02
NÁZOV VÝKRESU: BÚRACIE PRÁČE - postupnosť		FORMÁT: 2xA4	
